


護岸工事進捗状況 (4月16日時点)

— 施工済み護岸

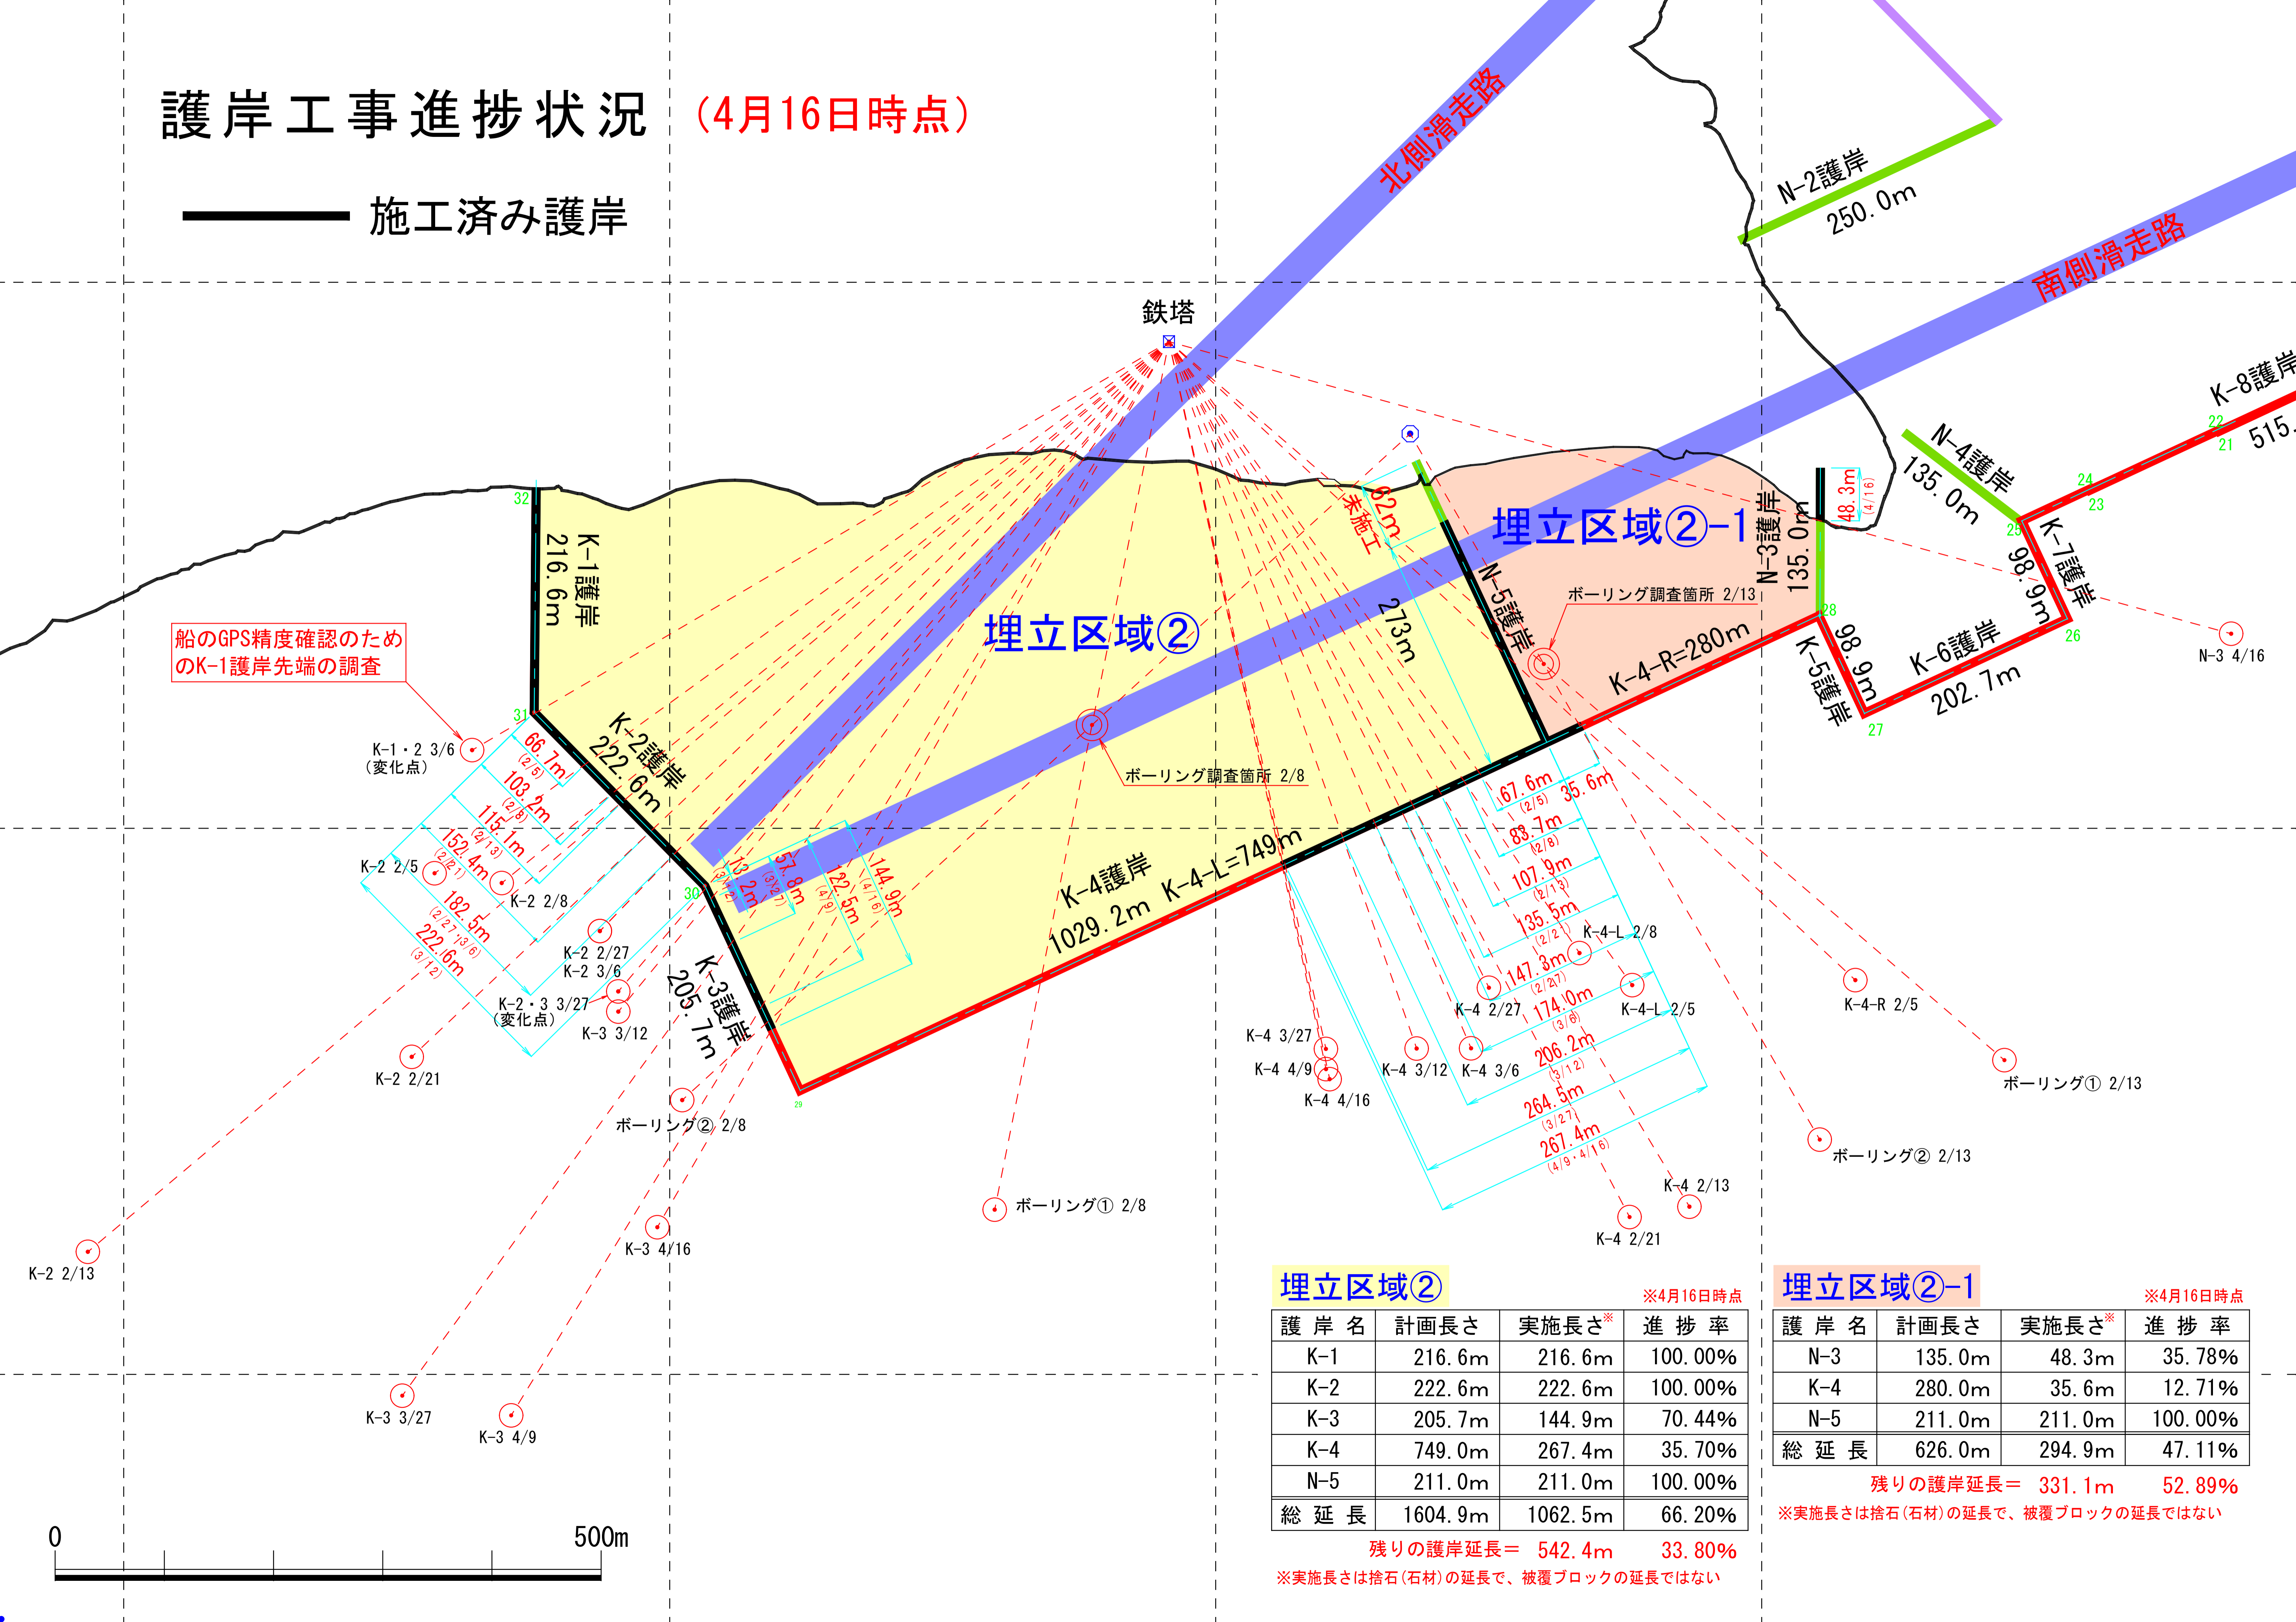

船のGPS精度確認のための
K-1護岸先端の調査

埋立区域②

※4月16日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
K-1	216.6m	216.6m	100.00%
K-2	222.6m	222.6m	100.00%
K-3	205.7m	144.9m	70.44%
K-4	749.0m	267.4m	35.70%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	1604.9m	1062.5m	66.20%

残りの護岸延長 = 542.4m 33.80%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

埋立区域②-1

※4月16日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
N-3	135.0m	48.3m	35.78%
K-4	280.0m	35.6m	12.71%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	626.0m	294.9m	47.11%

残りの護岸延長 = 331.1m 52.89%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

